



PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Letung, 25 Mei 2024

Nomor : 01/Lap-BLN/PWS-WCEC/5-2024
Lamp : 1 Berkas
Hal : Laporan Bulan Ke -1 (Ke- Satu)

Kepada Yth :

Bapak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pengawasan Pembangunan Jalan Teluk Kaut – Semuak – Atap Kec. Jemaja

di -

Tarempa

Dengan hormat.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Bulan Ke - 1 (Ke-Satu) periode 17 Mei 2024 – 25 Mei 2024 dengan bobot realisasi kemajuan pekerjaan dilapangan berdasarkan hasil pengukuran bersama sebesar 0,177% dari rencana sebesar 0,177% dengan deviasi sebesar -0,000% **(Nol Koma nol Persen).**

Demikianlah Laporan Laporan Bulan Ke - 1 (Ke-Satu) ini disampaikan kepada Bapak, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Konsultan Supervisi
PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

RAHMAT SUHADA, ST
Supervisi Engineer



PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Letung, 25 Juni 2024

Nomor : 02/Lap-BLN/PWS-WCEC/6-2024
Lamp : 1 Berkas
Hal : Laporan Bulan Ke -2 (Ke- Dua)

Kepada Yth :

Bapak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pengawasan Pembangunan Jalan Teluk Kaut – Semuak – Atap Kec. Jemaja

di -


Tarempa

Dengan hormat.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Bulan Ke - 2 (Ke- Dua) periode 26 Mei 2024 – 25 Juni 2024 dengan bobot realisasi kemajuan pekerjaan dilapangan berdasarkan hasil pengukuran bersama sebesar **7,714%** dari rencana sebesar **4.235%** dengan deviasi sebesar **+3.479%**

Demikianlah Laporan Laporan Bulan Ke - 2 (Ke-Dua) ini disampaikan kepada Bapak, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Konsultan Supervisi
PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT



PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

RAHMAT SUHADA, ST
Supervisi Engineer



PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

DOKUMENTASI PEKERJAAN BULAN KE-2

KEGIATAN : PENYELENGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN TELUK KAUT - SEMUAK - ATAP KEC. JEMAJA
LOKASI : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Galian Biasa



Galian Biasa



Galian Biasa



Timbunan Biasa dari Hasil Galian



Timbunan Biasa dari Hasil Galian



Timbunan Biasa dari Hasil Galian





PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Letung, 25 Juli 2024

Nomor : 03/Lap-BLN/PWS-WCEC/7-2024
Lamp : 1 Berkas
Hal : Laporan Bulan Ke -3 (Ke- Tiga)

Kepada Yth :

Bapak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pengawasan Pembangunan Jalan Teluk Kaut – Semuak – Atap Kec. Jemaja

di -

Tarempa

Dengan hormat.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Bulan Ke - 3 (Ke- Tiga) periode 26 Juni 2024 – 25 Juli 2024 dengan bobot realisasi kemajuan pekerjaan dilapangan berdasarkan hasil pengukuran bersama sebesar **27,177%** dari rencana sebesar **9,025%** dengan deviasi sebesar **+18,152%**

Demikianlah Laporan Laporan Bulan Ke - 3 (Ke-Tiga) ini disampaikan kepada Bapak, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Konsultan Supervisi
PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

RAHMAT SUHADA, ST
Supervisi Engineer




PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

DOKUMENTASI PEKERJAAN BULAN KE-3

KEGIATAN : PENYELENGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN TELUK KAUT - SEMUAK - ATAP KEC. JEMAJA
LOKASI : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TIMBUNAN BIASA DARI HASIL GALIAN

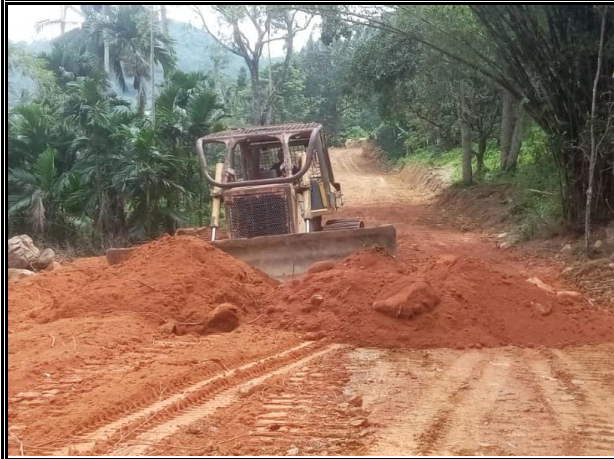

TIMBUNAN BIASA DARI HASIL GALIAN



TIMBUNAN BIASA DARI HASIL GALIAN



TIMBUNAN BIASA DARI HASIL GALIAN



TIMBUNAN BIASA DARI HASIL GALIAN



TIMBUNAN BIASA DARI HASIL GALIAN





PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Letung, 25 Agustus 2024

Nomor : 04/Lap-BLN/PWS-WCEC/8-2024
Lamp : 1 Berkas
Hal : Laporan Bulan Ke -4 (Ke- Empat)

Kepada Yth :

Bapak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pengawasan Pembangunan Jalan Teluk Kaut – Semuak – Atap Kec. Jemaja

di -

Tarempa

Dengan hormat.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Bulan Ke - 4 (Ke-Empat) periode 26 Juli 2024 – 25 Agustus 2024 dengan bobot realisasi kemajuan pekerjaan dilapangan berdasarkan hasil pengukuran bersama sebesar **39,561%** dari rencana sebesar **13,244%** dengan deviasi sebesar **+26,317%**

Demikianlah Laporan Laporan Bulan Ke - 4 (Ke-Empat) ini disampaikan kepada Bapak, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Konsultan Supervisi
PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT


 **PT. WANDRA CIPTA**
ENGINEERING CONSULTANT

RAHMAT SUHADA, ST
Supervisi Engineer



PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

DOKUMENTASI PEKERJAAN BULAN KE-4

KEGIATAN : PENYELENGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN TELUK KAUT - SEMUAK - ATAP KEC.
JEMAJA
LOKASI : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Beton fc'30 Mpa



Beton fc'30 Mpa



Beton fc'30 Mpa



Beton fc'30 Mpa



Beton fc'30 Mpa



Beton fc'30 Mpa





PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Letung, 25 September 2024

Nomor : 05/Lap-BLN/PWS-WCEC/9-2024
Lamp : 1 Berkas
Hal : Laporan Bulan Ke -5 (Ke- Lima)

Kepada Yth :

Bapak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pengawasan Pembangunan Jalan Teluk Kaut – Semuak – Atap Kec. Jemaja

di -

Tarempa

Dengan hormat.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Bulan Ke - 5 (Ke-Lima) periode 26 Agustus 2024 – 25 September 2024 dengan bobot realisasi kemajuan pekerjaan dilapangan berdasarkan hasil pengukuran bersama sebesar **25,416%** dari rencana sebesar **42,670%** dengan deviasi sebesar **+17,254%**

Demikianlah Laporan Laporan Bulan Ke - 5 (Ke-Lima) ini disampaikan kepada Bapak, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Konsultan Supervisi
PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT



PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

RAHMAT SUHADA, ST
Supervisi Engineer



**PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT**

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

DOKUMENTASI PEKERJAAN BULAN KE-5

KEGIATAN : PENYELENGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN TELUK KAUT - SEMUAK - ATAP KEC.
JEMAJA
LOKASI : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Penulangan Sayap



Penulangan Sayap dan Loneng



Sayap dan Loneng



Sayap dan Loneng



Galian Batu



Galian batu





PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Letung, 25 Oktober 2024

Nomor : 06/Lap-BLN/PWS-WCEC/10-2024
Lamp : 1 Berkas
Hal : Laporan Bulan Ke -6 (Ke- Enam)

Kepada Yth :

Bapak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pengawasan Pembangunan Jalan Teluk Kaut – Semuak – Atap Kec. Jemaja

di -

Tarempa

Dengan hormat.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Bulan Ke - 6 (Ke-Enam) periode 26 September 2024 – 25 Oktober 2024 dengan bobot realisasi kemajuan pekerjaan dilapangan berdasarkan hasil pengukuran bersama sebesar **50,125%** dari rencana sebesar **48,720%** dengan deviasi sebesar - **1,405%**

Demikianlah Laporan Laporan Bulan Ke - 6 (Ke-Enam) ini disampaikan kepada Bapak, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Konsultan Supervisi
PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT



PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

RAHMAT SUHADA, ST
Supervisi Engineer



PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

DOKUMENTASI PEKERJAAN BULAN KE-6

KEGIATAN : PENYELENGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN TELUK KAUT - SEMUAK - ATAP KEC. JEMAJA
LOKASI : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Penulangan Plat Duiker



Percetakan Plat Duiker



Percetakan Plat Duiker



Sayap dan Loneng



Pek. Galian batu



Pek. Galian Batu





PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Letung, 12 Desember 2024

Nomor : 07/Lap-BLN/PWS-WCEC/12-2024
Lamp : 1 Berkas
Hal : Laporan Bulan Ke -7 (Ke- Tujuh)

Kepada Yth :

Bapak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pengawasan Pembangunan Jalan Teluk Kaut – Semuak – Atap Kec. Jemaja

di -

Tarempa

Dengan hormat.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Bulan Ke - 7 (Ke-Tujuh) periode 26 Oktober 2024 – 12 Desember 2024 dengan bobot realisasi kemajuan pekerjaan dilapangan berdasarkan hasil pengukuran bersama sebesar **100.00%** dari rencana sebesar **100.00%** dengan deviasi sebesar - **0.00% (Pekerjaan Selesai)**

Demikianlah Laporan Laporan Bulan Ke - 7 (Ke-Tujuh) ini disampaikan kepada Bapak, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Konsultan Supervisi
PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

RAHMAT SUHADA, ST
Supervisi Engineer



**PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT**

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

DOKUMENTASI PEKERJAAN BULAN KE-7

KEGIATAN : PENYELENGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN TELUK KAUT - SEMUAK - ATAP KEC. JEMAJA
LOKASI : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SAND CONE TEST



SAND CONE TEST



SAND CONE TEST



SAND CONE TEST



TEST PIT



TEST PIT






PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

DOKUMENTASI PEKERJAAN BULAN KE-7

KEGIATAN : PENYELENGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN TELUK KAUT - SEMUAK - ATAP KEC. JEMAJA
LOKASI : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TEST PIT

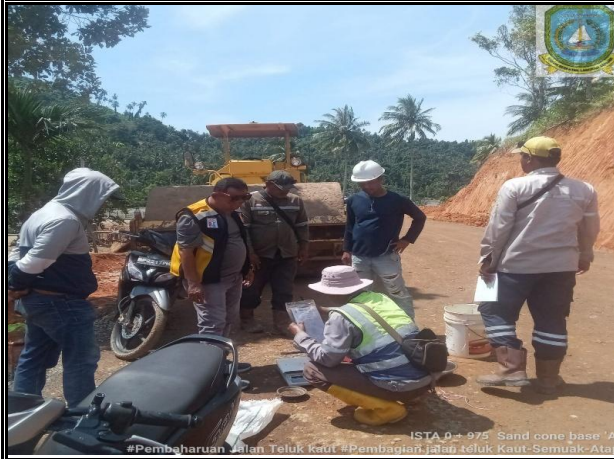

TEST PIT



Galian Boxculvert 1m x 1m



Beton fc'10 Mpa



Pemasangan Boxculvert Beton fc'30 Mpa



Pemasangan Boxculvert Beton fc'30 Mpa






**PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT**

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau


DOKUMENTASI PEKERJAAN BULAN KE-7

KEGIATAN : PENYELENGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN TELUK KAUT - SEMUAK - ATAP KEC. JEMAJA
LOKASI : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS


PENGHAMPARAN BASE A

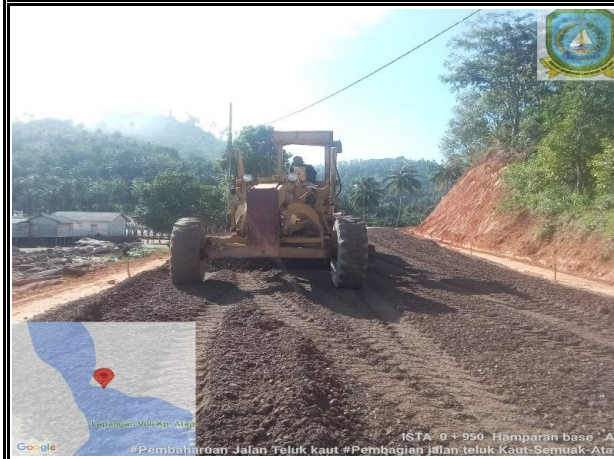

PENGHAMPARAN BASE A

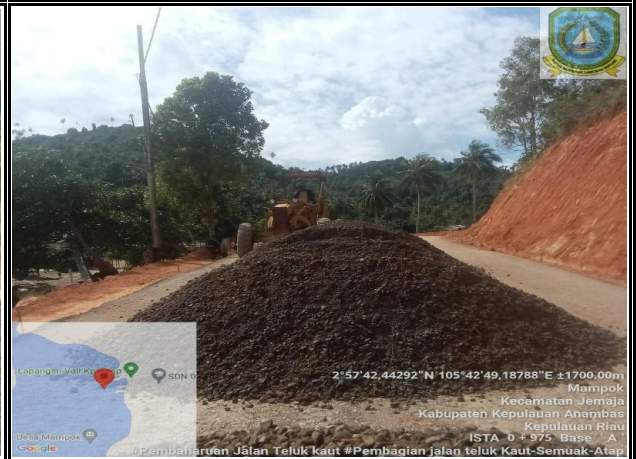


Percetakan Plat Duiker

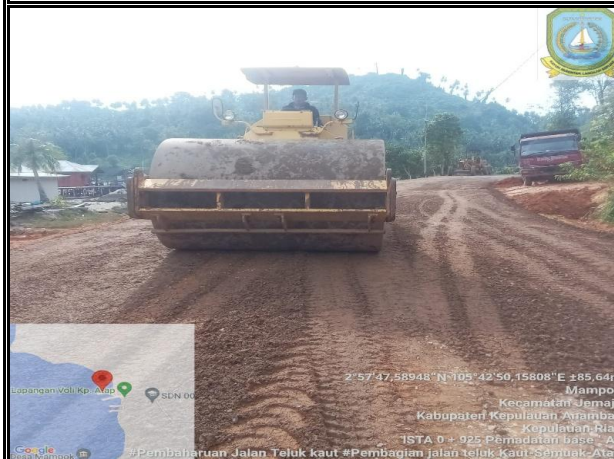

Sayap dan Loneng



PENYIRAMAN BASE A

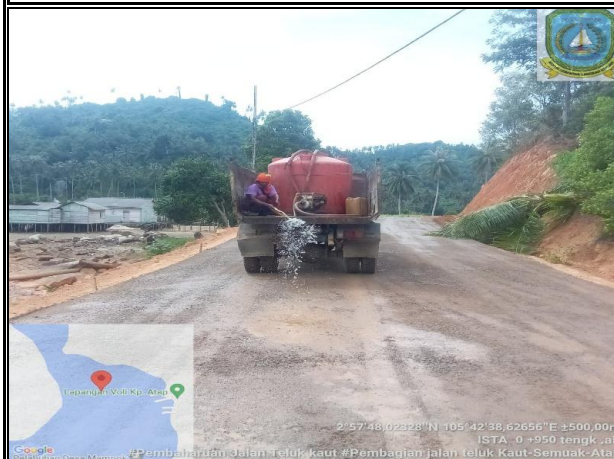

PEMADATAN BASE A





PT. WANDRA CIPTA
ENGINEERING CONSULTANT

Jl. PAHLAWAN NO. 88, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

DOKUMENTASI PEKERJAAN BULAN KE-7

KEGIATAN : PENYELENGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN TELUK KAUT - SEMUAK - ATAP KEC. JEMAJA
LOKASI : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

LAPIS RESAP PENGIKAT



PENGHAMPARAN AC-WC



PENGHAMPARAN AC-WC



PEMADATAN AC-WC



PEMADATAN AC-WC



PEMADATAN AC-WC

